

DOMINE O MS PROJECT®

Planejamento e Controle
Profissional de Projetos



Karolina Poznyakov,
MSc, PMP®, IPMA-D



Aprenda na prática as melhores
técnicas de planejamento
e controle de projetos

Edição 2025 – Revisão B

 @pavelconsultoria

 (21) 99571-6270

Sumário

1. Gerenciamento de Projetos	8
1.1 Gerência de Projetos.....	8
1.2 Ciclo de Vida de um Projeto.....	8
1.3 Definição de Projeto.....	10
2. Planejamento e Controle de Projetos.....	10
2.1 Programação de Projetos com Limitações de Recursos.....	10
2.2 Múltiplos Projetos.....	11
3. Técnicas de Planejamento.....	12
3.1. Gráfico de Gantt	12
3.2. Técnicas de Programação com Redes.....	12
4. Introdução ao Microsoft Project®	14
4.1. Introdução.....	14
4.2. Configuração do MS Project	15
4.3. Conhecendo a Área de Trabalho.....	18
4.4. Criando um novo Projeto	21
4.5. Informações Iniciais do Projeto.....	21
4.6. Calendários	23
4.7. Tarefas de um Projeto.....	27
4.8. Estruturação de um Projeto	30
4.9. Interdependência entre as tarefas.....	30
4.10. Restrições entre as tarefas.....	32
4.11. Recursos.....	33
4.12 Customização do MS Project	42
5 Indicadores do MS Project	49
5.1. Campo Indicadores	49
6. Planejando e Gerenciando com o Project.....	51
6.1. Caminho Crítico.....	51
6.2 Otimização de Recursos.....	52
6.3. Nivelamento de Recursos.....	54
6.4. Linha de Base	57
6.5 Acompanhando e Controlando o Projeto	59
7 Relatórios.....	68
7.1 Novo Relatório	68
7.2 Painéis.....	69
7.3 Recursos.....	69

grafo, denominado caminho crítico, formado pelas denominadas atividades críticas. Observe o que se apresenta na Figura 2.

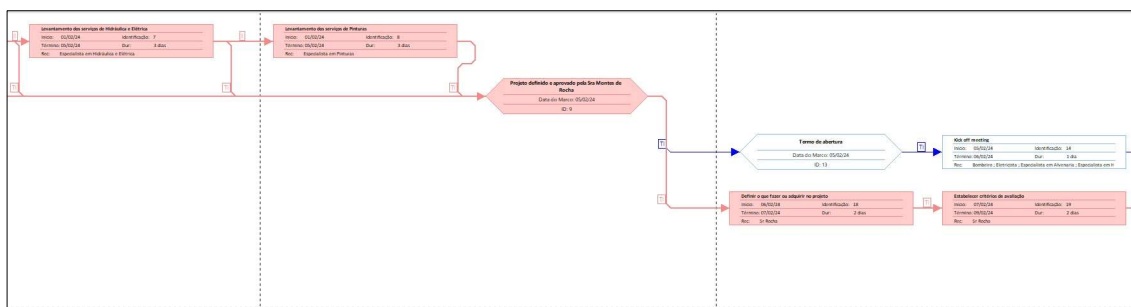


Figura 4 - Realce do caminho crítico do projeto.

3.2.1. As Redes PERT

Surgem pela necessidade de proceder ao encadeamento e interligação das atividades que conduzem ao objeto final, determinando-se depois o tempo de duração dessas atividades. A representação gráfica dos resultados deste trabalho é simples e corresponde ao que se designa de Rede de PERT.

Considerações sobre as Redes de PERT:

- 1) Permite não só programar as atividades, mas também controlá-las, à medida que são sendo realizadas, de forma a que sejam respeitados os prazos para elas estabelecidos e, no caso de eventuais falhas, permite a tomada de decisões corretivas.
- 2) Permite fazer estimativas probabilísticas quanto ao período de execução das atividades com mais interesse.

3.2.2. CPM - Critical Path Method

Após o traçar da rede PERT podemos finalmente proceder à determinação da duração do projeto. Para tal considera-se o caminho mais desfavorável para a realização do programa - caminho crítico - ou seja, o caminho por onde passam as atividades de maior duração - atividades críticas. A duração do programa será igual à soma das atividades críticas que o constituem. Da definição anterior depreende-se que, se todas as durações das atividades de um caminho crítico permanecer constantes e se houver atraso apenas em uma delas, o atraso final na realização do projeto será igual ao atraso parcial.

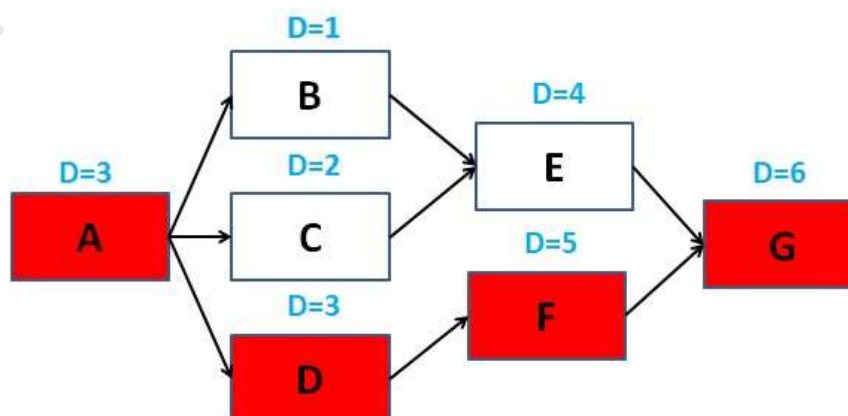


Figura 5 - Caminho crítico do projeto (vermelho)

determinar o tipo de relacionamento que ocorre no projeto que está sendo desenvolvido.

O relacionamento entre as tarefas pode ser criado através da coluna predecessora no gráfico de Gantt ou através da edição das informações da tarefa como visto anteriormente.

O padrão de relacionamento definido pelo Project é o **Término – a – Início (TI)**. Para colocar outro tipo de relacionamento basta digitar a sigla de relacionamento desejada após o número da tarefa que será predecessora.

Tipo de Relacionamento	Descrição	Apresentação no Gráfico de Gantt
Término - a - Início (TI)	A tarefa só começa quando a predecessora termina	
Início - a - Início (II)	A tarefa só começa quando a predecessora começa	
Término - a - Término (TT)	A tarefa só termina quando a predecessora termina	
Início - a - Término (IT)	A tarefa só termina quando a predecessora começa	

Figura 29 – Relacionamento entre as tarefas

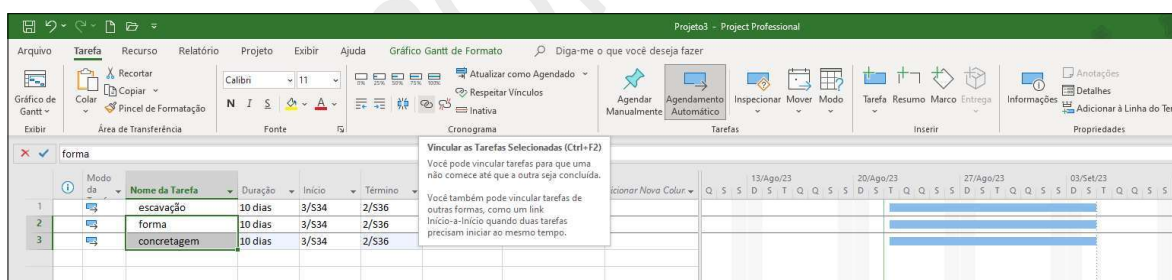


Figura 30 – Criando relacionamento entre as tarefas

Algumas vezes é necessário incluir tempos de antecipação ou de folga⁶ entre as tarefas. A folga é a situação onde existe um tempo livre entre o fim de uma tarefa e o início da seguinte e antecipação é quando uma tarefa se inicia antes da anterior ter atingido o fim.

Para colocarmos esses tempos de folga ou antecipação, basta ir até a coluna 'Predecessoras' e ao lado do número da tarefa que é precedida, digita-se o número de dias de folga (número positivo) e antecipação (número negativo).

⁶ FOLGA TOTAL (*Total Float*): quanto uma atividade pode atrasar sem comprometer o prazo do projeto; FOLGA LIVRE (*Free Float*): quanto uma atividade pode atrasar sem comprometer uma atividade sucessora; FOLGA DO PROJETO (*Project Float*): quanto o projeto pode atrasar sem comprometer uma data imposta externamente.

Por exemplo, a **tarefa 2 – Pintar** só pode ser iniciada após a **tarefa 1- Lixar** ser concluída. Dessa maneira, na linha da **tarefa dois** e na coluna predecessoras, digitamos: 1TI + 2 dias.

	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q
1	lixar	10 dias	3/S34	2/S36																											
2	pintar	5 dias	3/S36	2/S37	1																										
3	limpar	3 dias	5/S36	2/S37	2II+2 dias																										
4	vistoria	1 dia	2/S37	2/S37	2TT																										

Figura 31 – Inserindo tempo de espera e antecipação

4.10. Restrições entre as tarefas

As restrições (*Constraints*) impõem limites na forma como o programa calcula as datas de início e de término das tarefas. Elas podem ser de vários tipos:

- **O Mais Tarde Possível:** Agenda a tarefa para que ela inicie o mais tarde possível sem atrasar as tarefas subsequentes. Não insira uma data de restrição com essa restrição.
- **O Mais Breve Possível:** Agenda a tarefa para que ela inicie o quanto antes. Essa é a restrição padrão para tarefas. Não insira uma data de restrição com essa restrição.
- **Não Terminar Antes De:** Agenda a tarefa para que ela termine em uma data específica ou após essa data. Use essa restrição para se certificar de que uma tarefa não terminará antes de uma data específica.
- **Não Terminar Depois De:** Agenda a tarefa para que ela termine em uma data específica ou antes dessa data. Use essa restrição para se certificar de que uma tarefa não terminará após uma data específica.
- **Deve Terminar Em:** Agenda a tarefa para que ela termine em uma data específica. Define as datas de término antecipado, agendado e atrasado com a data inserida, e fixa a tarefa na agenda.
- **Deve Iniciar Em:** Agenda a tarefa para que ela inicie em uma data específica. Define as datas de início antecipado, agendado e atrasado com a data inserida, e fixa a tarefa na agenda.
- **Não Iniciar Antes De:** Agenda a tarefa para que ela inicie em uma data específica ou após essa data. Use essa restrição para se certificar de que uma tarefa não iniciará antes de uma data específica.
